



Saiba mais sobre a construção das três novas Praças de Pedágio e a reforma e ampliação das praças de Venâncio Aires e Candelária, na RSC-287

As construções das novas Praças de Pedágio da RSC-287 estão a todo vapor!

Os trabalhos de implantação estão acontecendo no km 47, em Taquari, no km 168, em Paraíso do Sul, e no km 220, em Santa Maria.

Nas praças já existentes, de Venâncio Aires e Candelária, estamos realizando os serviços de recuperação e ampliação.

O objetivo é que todas as alterações estejam prontas ainda neste ano de 2022.

Confira mais informações:

• Obra 01: Implantação da Praça de Pedágio P1 em Taquari

Local: km 47+626 da RSC-287

Contratante: Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Responsável técnico da contratante: Renato Ribeiro Bortoletti - CREA Nº PE 20168387

Contratada: Sacyr Construcción S.A. do Brasil

Responsável técnico da contratada: José Eduardo Paro Ribeiro - CREA Nº SP 5061966208

Prazo da Concessão: 30 anos

Data de Início da Obra: Novembro/2021

Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Maio/2	Jun/2	Jul/22	Ago/22	Set/22
						2	2			
Supres	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Pavime	Estru	Instala	Testag	Conclu
são e	anagem	anagem	anagem	anagem	anagem	ntação	turas	ção de	em de	são e
regular								Equipa	Equipa	Homol
ização								mentos	mentos	ogação
do										
terren										
0										







Foto e planta da Praça de Pedágio de Taquari.







• Obra 02: Reforma e Ampliação da Praça de Pedágio P2 em Venâncio Aires

Local: km 86+470 da RSC-287

Contratante: Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Responsável técnico da contratante: Renato Ribeiro Bortoletti - CREA Nº PE 20168387

Contratada: Sacyr Construcción S.A. do Brasil

Responsável técnico da contratada: José Eduardo Paro Ribeiro - CREA Nº SP 5061966208

Prazo da Concessão: 30 anos

Data de Início da Obra: Novembro/2021

Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Maio/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22
Supres são e regulari zação do terreno	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Pavime ntação e Estrutur as	Estrutur as e Instalaç ão de Equipa mentos	Testage m de Equipa mentos	Conclus ão e Homolo gação









Foto e planta da Praça de Pedágio de Venâncio Aires.





Obra 03: Reforma e Ampliação da Praça de Pedágio P3 em Candelária

Local: km 131+213 da RSC-287

Contratante: Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Responsável técnico da contratante: Renato Ribeiro Bortoletti - CREA Nº PE 20168387

Contratada: Sacyr Construcción S.A. do Brasil

Responsável técnico da contratada: José Eduardo Paro Ribeiro - CREA Nº SP 5061966208

Prazo da Concessão: 30 anos

Data de Início da Obra: Novembro/2021

Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Maio/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22
Supres são e regulari zação do terreno	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Terrapla nagem	Pavime ntação e Estrutur as	Estrutur as e Instalaç ão de Equipa mentos	Testage m de Equipa mentos	Conclus ão e Homolo gação










Foto e planta da Praça de Pedágio de Candelária.





Obra 04: Implantação da Praça de Pedágio P4 em Paraíso do Sul

Local: km 168+668 da RSC-287

Contratante: Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Responsável técnico da contratante: Renato Ribeiro Bortoletti - CREA Nº PE 20168387


Contratada: Sacyr Construcción S.A. do Brasil

Responsável técnico da contratada: José Eduardo Paro Ribeiro - CREA Nº SP 5061966208

Prazo da Concessão: 30 anos

Data de Início da Obra: Novembro/2021

Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Maio/2	Jun/2	Jul/22	Ago/22	Set/22
						2	2			
Supres	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Pavime	Estru	Instala	Testag	Conclu
são e	anagem	anagem	anagem	anagem	anagem	ntação	turas	ção de	em de	são e
regular								Equipa	Equipa	Homol
ização								mentos	mentos	ogação
do										
terren										
0										

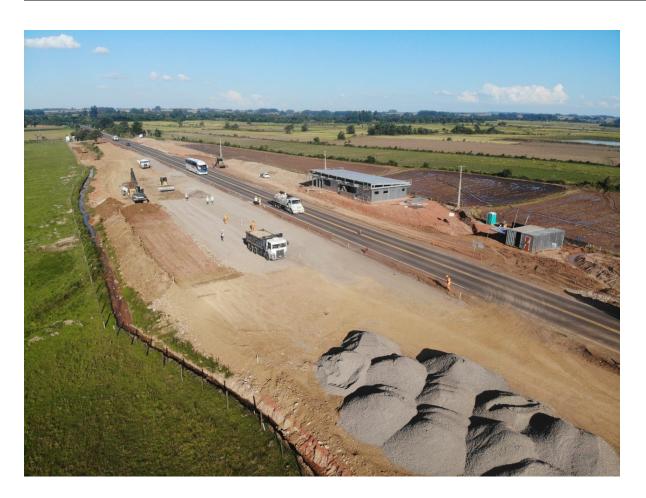








Foto e planta da Praça de Pedágio de Paraíso do Sul.





Obra 05: Implantação da Praça de Pedágio P5 em Santa Maria

Local: km 220+717 da RSC-287

Contratante: Concessionária Rota de Santa Maria S.A.

Responsável técnico da contratante: Renato Ribeiro Bortoletti - CREA Nº PE 20168387

Contratada: Sacyr Construcción S.A. do Brasil

Responsável técnico da contratada: José Eduardo Paro Ribeiro - CREA Nº SP 5061966208

Prazo da Concessão: 30 anos

Data de Início da Obra: Novembro/2021

Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Maio/2	Jun/2	Jul/22	Ago/22	Set/22
						2	2			
Supres	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Terrapl	Pavime	Estru	Instala	Testag	Conclu
são e	anagem	anagem	anagem	anagem	anagem	ntação	turas	ção de	em de	são e
regular								Equipa	Equipa	Homol
ização								mentos	mentos	ogação
do										
terren										
0										









Foto e planta da Praça de Pedágio de Santa Maria.
